

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA USB LEONOVILDO BARROSO NO MUNICÍPIO DE SÃO LUIS DO CURU-CE.
 LOCAL: MUNICÍPIO DE SÃO LUIS DO CURU
 EMPRESA: ARTEC CONSTRUTORA E ARQUITETURA LTDA
 CNPJ: 51.007.107/0001-00

BOLETIM DE MEDIÇÃO
 CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO LUIS DO CURU
 LICITAÇÃO: 20260097
 BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº: 02
 PRAZO DE OBRA: 2 MESES
 PERÍODO DE MEDIÇÃO: 01/04/2026 - 31/05/2026
 BDI: 23,38%

VALORES (R\$)		CONTRATO INICIAL (A):		CONTRATO REAJUSTADO (A+B):		MEDIÇÃO ACUMULADA:		SALDO A MEDIR:		VALOR DA MEDIÇÃO:	
CONTRATO INICIAL (A):	R\$ 150.469,45	REAJUSTES (B):	R\$ 18.951,55	CONTRATO REAJUSTADO (A+B):	R\$ 169.421,00	MEDIÇÃO ACUMULADA:	R\$ 142.140,38	SALDO A MEDIR:	R\$ 10.890,44	VALOR DA MEDIÇÃO:	R\$ 73.168,88
											43,65%

NUM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UN.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO (R\$)	TOTAL (R\$)	PERÍODO	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO TOTAL	VALOR PERÍODO (R\$)	VALOR ACUMULADO ANTERIOR (R\$)	VALOR ACUMULADO (R\$)	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)	ACUMULADO (%)	PROPOSTA	
																QUANTIDADES	FINANCEIRO
1	SE000	SERVIÇOS PRELIMINARES															
1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	6,00	R\$ 202,21	R\$ 1.213,26	-	6,00	6,00	R\$ 4.881,30	R\$ 19.683,96	R\$ 24.565,26	R\$ 1.627,09	R\$ 93,79%			
1.2	C0330	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE MAT. C/AQUISIÇÃO	M3	24,00	R\$ 124,56	R\$ 2.989,44	-	24,00	24,00	R\$ -	R\$ 2.989,44	R\$ 2.989,44	R\$ -	R\$ 100,00%			
1.3	C1065	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	M2	126,36	R\$ 39,63	R\$ 5.007,65	-	126,36	126,36	R\$ -	R\$ 5.007,65	R\$ 5.007,65	R\$ -	R\$ 100,00%			
1.4	C1045	DEMOLIÇÃO DE COBERTURA C/TELHAS CERÂMICAS	M2	29,24	R\$ 16,99	R\$ 496,79	-	29,24	29,24	R\$ -	R\$ 496,79	R\$ 496,79	R\$ -	R\$ 100,00%			
1.5	C1043	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TUAIS/S/ REAPROVEITAMENTO	M3	22,45	R\$ 84,93	R\$ 1.906,68	-	22,45	22,45	R\$ -	R\$ 1.906,68	R\$ 1.906,68	R\$ -	R\$ 100,00%			
1.6	90778	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	80,00	R\$ 162,71	R\$ 13.016,80	30,00	40,00	70,00	R\$ 4.881,30	R\$ 6.508,40	R\$ 11.389,70	R\$ 1.627,10	R\$ 87,50%			
1.7	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	M2	110,37	R\$ 14,15	R\$ 1.561,74	-	110,37	110,37	R\$ -	R\$ 1.561,74	R\$ 1.561,74	R\$ -	R\$ 100,00%			
2	ES000	ESQUADRIAS E FERRAGENS															
2.1	C4428	PORTA TIPO PARAVÁ (0,80 x 2,10 m), COMPLETA	UND	2,00	R\$ 1.210,54	R\$ 2.421,08	2,00	-	2,00	R\$ 2.421,08	R\$ -	R\$ 2.421,08	R\$ -	R\$ 100,00%			
2.2	C1967	PORTA DE ALUMÍNIO ANODIZADO COMPACTA	M2	5,46	R\$ 706,58	R\$ 3.857,93	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.857,93	R\$ 0,00%			
2.3	C2671	VIDRO COMUM EM CAIXILHOS C/MASSA ESP = 5mm, COLOCADO	M2	5,46	R\$ 223,10	R\$ 1.218,13	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.218,13	R\$ 0,00%			
3	RE000	REVESTIMENTOS															
3.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEAR TRAÇO 1:3 ESP = 5mm P/ PAREDE	M2	110,37	R\$ 9,44	R\$ 1.041,89	-	110,37	110,37	R\$ -	R\$ 1.041,89	R\$ 1.041,89	R\$ -	R\$ 100,00%			
3.2	C3245	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEAR, TRAÇO 1:5	M2	110,37	R\$ 45,70	R\$ 5.043,91	-	110,37	110,37	R\$ -	R\$ 5.043,91	R\$ 5.043,91	R\$ -	R\$ 100,00%			
3.3	C4434	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. (cm²) - PEI-S/PELA P/ PAREDE	M2	102,76	R\$ 166,21	R\$ 17.079,74	-	102,76	102,76	R\$ -	R\$ 17.079,74	R\$ 17.079,74	R\$ -	R\$ 100,00%			
3.4	C1120	JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	M2	102,76	R\$ 13,26	R\$ 1.362,60	-	102,76	102,76	R\$ -	R\$ 1.362,60	R\$ 1.362,60	R\$ -	R\$ 100,00%			
3.5	C4442	CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. PRE-FABRICADA ATÉ 10x10cm (100cm²) - DECORATIVA - P/ PAREDE	M2	7,61	R\$ 102,02	R\$ 776,37	-	7,61	7,61	R\$ -	R\$ 776,37	R\$ 776,37	R\$ -	R\$ 100,00%			
3.6	C1102	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRE-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 10x10 cm (100 cm²) - DECORATIVA (PAREDE/PISO)	M2	7,61	R\$ 18,00	R\$ 136,98	-	7,61	7,61	R\$ -	R\$ 136,98	R\$ 136,98	R\$ -	R\$ 100,00%			
4	PS0	PISO															
4.1	C4439	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ACIMA DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-S/PELA P/ PISO	M2	102,47	R\$ 154,57	R\$ 15.838,79	102,47	-	102,47	R\$ 15.838,79	R\$ -	R\$ 15.838,79	R\$ -	R\$ 100,00%			
4.2	C2179	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/PENEAR, TRAÇO 1:4 - ESP = 3cm	M2	102,47	R\$ 33,52	R\$ 3.434,79	-	102,47	102,47	R\$ -	R\$ 3.434,79	R\$ 3.434,79	R\$ -	R\$ 100,00%			
											R\$ 20.632,33	R\$ 3.434,79	R\$ 20.632,33	R\$ -	100,00%		

Paulo Henrique Muniz
 Engenheiro Civil
 OREAMEZ 50.456-D



REFORMA E AMPLIAÇÃO DA USB LEOGIVILDO BARROSO NO MUNICÍPIO DE SAO LUIS DO CURU-CE.

EMPRESA: ARTEC CONSTRUTORA E ARQUITETURA LTDA
CNPJ: 51.007.107/0001-00

BOLETIM DE MEDIÇÃO


CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAO LUIS DO CURU

CONTRATO Nº: 02
REALISTADO (A+B): R\$ 150.409,45
MEDIÇÃO ACUMULADA: R\$ 18.551,55
SALDO A MEDIR: R\$ 169.041,00
VALOR DA MEDIÇÃO: R\$ 142.740,38
PERÍODO DE MEDIÇÃO: 2 MESES
01/04/2026 - 19/05/2026
VALOR DA MEDIÇÃO: R\$ 10.890,44
PERCENTUAL: 73,798,86

PROPOSTA

NUM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UN.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO (R\$)	TOTAL (R\$)	PERÍODO	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO TOTAL	VALOR PERÍODO (R\$)	VALOR ACUMULADO ANTERIOR (R\$)	VALOR ACUMULADO (R\$)	SALDO (R\$)	PERCENTUAL (%)
4.3	C1120	REJUNTAMENTO C/ARG. PRE-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	M2	102,47	R\$ 13,26	R\$ 1.358,75	102,47	-	102,47	R\$ 1.358,75	R\$ -	R\$ 1.358,75	R\$ -	100,00%
5	PINTURA	LATEX DUAS DEMÃO EM PAREDES INTERNAS SIMASSA	M2	437,69	R\$ 27,40	R\$ 11.992,71	437,69	-	437,69	R\$ 11.992,71	R\$ -	R\$ 11.992,71	R\$ -	62,38%
5.1	C1615	ESMALTE DUAS DEMÃO EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	98,60	R\$ 31,20	R\$ 3.076,32	98,60	-	98,60	R\$ 3.076,32	R\$ -	R\$ 3.076,32	R\$ -	100,00%
5.2	C1280	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃO CIMASSA DE PVA	M2	437,69	R\$ 17,03	R\$ 7.453,86	437,69	-	437,69	R\$ 7.453,86	R\$ -	R\$ 7.453,86	R\$ -	100,00%
5.3	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃO CIMASSA DE PVA	M2	437,69	R\$ 17,03	R\$ 7.453,86	437,69	-	437,69	R\$ 7.453,86	R\$ -	R\$ 7.453,86	R\$ -	100,00%
5.4	C2461	TEXTURA ACRILICA 1 DEMÃO EM PAREDES EXTERNAS	M2	90,30	R\$ 18,08	R\$ 1.632,62	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.632,62	0,00%
6	SISTEMA ELÉTRICO E LÓGICO					R\$ 11.551,94				R\$ -	R\$ -	R\$ 11.551,94	R\$ -	100,00%
6.1	C1947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/1 LÂMPADA DE 20W	PT	16,00	R\$ 334,01	R\$ 5.344,16	16,00	16,00	16,00	R\$ 5.344,16	R\$ 5.344,16	R\$ 5.344,16	R\$ -	100,00%
6.2	C1640	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A	UND	8,00	R\$ 100,86	R\$ 806,88	8,00	8,00	8,00	R\$ 806,88	R\$ 806,88	R\$ 806,88	R\$ -	100,00%
6.3	C1092	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR C/BARRAMENTO	UND	6,00	R\$ 29,57	R\$ 177,42	6,00	6,00	6,00	R\$ 177,42	R\$ 177,42	R\$ 177,42	R\$ -	100,00%
6.4	C2067	ATÉ 12 DIVISÕES 207X32X95mm, ELÉTRODUTO PVC ROSC. D=25mm (3/4")	UND	1,00	R\$ 361,10	R\$ 361,10	1,00	1,00	1,00	R\$ 361,10	R\$ 361,10	R\$ 361,10	R\$ -	100,00%
6.5	C1186	PROJETOR EM ALUMÍNIO, C/ LÂMPADA DE VAPOR METÁLICO E FOTOCELULA ATÉ 400W	M	50,00	R\$ 14,93	R\$ 746,50	50,00	50,00	50,00	R\$ 746,50	R\$ 746,50	R\$ 746,50	R\$ -	100,00%
6.6	C2045	TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A 250V	UND	2,00	R\$ 491,50	R\$ 983,00	2,00	2,00	2,00	R\$ 983,00	R\$ 983,00	R\$ 983,00	R\$ -	100,00%
6.7	C2484	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2	UND	8,00	R\$ 28,61	R\$ 228,88	8,00	8,00	8,00	R\$ 228,88	R\$ 228,88	R\$ 228,88	R\$ -	100,00%
6.8	C0540	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA COM 50% NOVA	M	330,00	R\$ 8,80	R\$ 2.904,00	330,00	330,00	330,00	R\$ 2.904,00	R\$ 2.904,00	R\$ 2.904,00	R\$ -	100,00%
7	COBERTURA					R\$ 5.828,70				R\$ -	R\$ 5.828,70	R\$ 5.828,70	R\$ -	100,00%
7.1	C2201	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA COM 50% NOVA	M2	29,24	R\$ 75,24	R\$ 2.200,02	29,24	29,24	29,24	R\$ 2.200,02	R\$ 2.200,02	R\$ 2.200,02	R\$ -	100,00%
7.2	C0660	CALHA DE CHAPA GALVANIZADA 26 DESENVOLVIMENTO 33cm	M	44,00	R\$ 82,47	R\$ 3.628,68	44,00	44,00	44,00	R\$ 3.628,68	R\$ 3.628,68	R\$ 3.628,68	R\$ -	100,00%
8	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA					R\$ 3.000,63				R\$ -	R\$ 3.000,63	R\$ 3.000,63	R\$ 0,01	0,00%
8.1	C0702	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	28,22	R\$ 37,48	R\$ 1.057,69	28,22	28,22	28,22	R\$ 1.057,69	R\$ 1.057,69	R\$ 1.057,69	R\$ -	100,00%
8.2	C2532	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 20KM	M3	28,22	R\$ 68,95	R\$ 1.942,95	28,22	28,22	28,22	R\$ 1.942,95	R\$ 1.942,95	R\$ 1.942,95	R\$ -	100,00%
9	SERVIÇOS DIVERSOS					R\$ 171,50				R\$ -	R\$ 171,50	R\$ 171,50	R\$ -	0,00%
9.1	C1628	LIMPEZA GERAL	M2	9,80	R\$ 17,50	R\$ 171,50	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ 171,50	R\$ -	0,00%
10	PÓRTRICO DE ENTRADA E FACHADA					R\$ 38.531,38				R\$ 34.229,91	R\$ 34.229,91	R\$ 34.229,91	R\$ 4.015,81	0,00%
10.1	C2784	ESCALVAÇÃO MANUAL SOLO DE TA.CAT. PROF. ATÉ 1,50m	M3	0,48	R\$ 66,24	R\$ 31,80	0,48	-	0,48	R\$ 31,80	R\$ 31,80	R\$ 31,80	R\$ -	100,00%
10.2	C0054	ALVENARIA DE EMBASSAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA	M3	0,29	R\$ 671,50	R\$ 194,74	0,29	-	0,29	R\$ 194,74	R\$ 194,74	R\$ 194,74	R\$ -	100,00%

Paulo Henrique Muniz
Engenheiro Civil
CREA/CE: 50.456-D



REFORMA E AMPLIAÇÃO DA USB LEONILDO BARROSO NO MUNICÍPIO DE SÃO LUIS DO CURU-CE.

LOCAL: MUNICÍPIO DE SÃO LUIS DO CURU
EMPRESA: ARKTEC CONSTRUTORA E ARQUITETURA LTDA
CNPJ: 51.007.107/0001-00

BOLETIM DE MEDIÇÃO

CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO LUIS DO CURU

LICITAÇÃO: 20260097

BOLETIM DE MEDIÇÃO N.º: 02
PRAZO DE OBRA: 23,38%
PERÍODO DE MEDIÇÃO: 2 MESES

01/04/2026 - 19/05/2026

VALORES (R\$)		CONTRATO INICIAL (A):	R\$	150.499,45	PORC (%)
REALISTES (B):	R\$	18.551,55	-	-	-
CONTRATO REALIZADO (A+B):	R\$	169.041,00	-	-	-
MEDIÇÃO ACUMULADA:	R\$	142.740,38	84,44%	84,44%	84,44%
SALDO A MEDIR:	R\$	10.890,44	6,44%	6,44%	6,44%
VALOR DA MEDIÇÃO:	R\$	73.798,86	43,66%	43,66%	43,66%

PROPOSTA

NUM	CODIGO	DISCRIMINAÇÃO	UN.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO (R\$)	TOTAL (R\$)	PERÍODO	QUANTIDADES		FINANCEIRO				PERCENTUAL (%)
								ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO TOTAL	VALOR PERÍODO (R\$)	VALOR ACUMULADO ANTERIOR (R\$)	VALOR ACUMULADO (R\$)	SALDO (R\$)	
10.3	C0056	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIPOLO FIRADO, C/ ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA (1:2:8)	M3	0,19	R\$ 726,78	R\$ 138,09	0,19	-	0,19	R\$ 138,09	R\$ -	R\$ 138,09	R\$ -	100,00%
10.4	C1399	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP = 12mm UTIL. 5X	M2	19,01	R\$ 149,34	R\$ 2.838,95	19,01	-	19,01	R\$ 2.838,95	R\$ -	R\$ 2.838,95	R\$ -	100,00%
10.5	C0829	CONCRETO CICLOPICO FCK 10/MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP)	M3	3,17	R\$ 674,19	R\$ 2.137,18	3,17	-	3,17	R\$ 2.137,18	R\$ -	R\$ 2.137,18	R\$ -	100,00%
10.6	C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ELEVAÇÃO	M3	3,17	R\$ 216,26	R\$ 685,54	3,17	-	3,17	R\$ 685,54	R\$ -	R\$ 685,54	R\$ -	100,00%
10.7	C0216	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	KG	197,00	R\$ 13,78	R\$ 2.714,66	197,00	-	197,00	R\$ 2.714,66	R\$ -	R\$ 2.714,66	R\$ -	100,00%
10.8	C0217	ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm	M2	120,00	R\$ 13,81	R\$ 1.657,20	120,00	-	120,00	R\$ 1.657,20	R\$ -	R\$ 1.657,20	R\$ -	100,00%
10.9	C4418	LAJE PRÉ-FABRICADA P/ FORRO - VAO DE 2,01 A 3 m	M2	33,12	R\$ 142,08	R\$ 4.705,69	33,12	-	33,12	R\$ 4.705,69	R\$ -	R\$ 4.705,69	R\$ -	100,00%
10.10	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENERAR TRAÇO 1:3 ESP = 5mm P/ PAREDE	M2	85,25	R\$ 9,44	R\$ 804,76	85,25	-	85,25	R\$ 804,76	R\$ -	R\$ 804,76	R\$ -	100,00%
10.11	C3245	EMBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENERAR, TRAÇO 1:5	M2	85,25	R\$ 45,70	R\$ 3.895,93	85,25	-	85,25	R\$ 3.895,93	R\$ -	R\$ 3.895,93	R\$ -	100,00%
10.12	C4434	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ARG. CIMENTO E AREIA ACIMA DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PAREDE	M2	85,25	R\$ 166,21	R\$ 14.169,40	74,23	-	74,23	R\$ 12.337,77	R\$ -	R\$ 12.337,77	R\$ -	87,07%
10.12	C4434	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ARG. CIMENTO E AREIA ACIMA DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PAREDE	M2	18,90	R\$ 166,21	R\$ 3.141,37	12,56	-	12,56	R\$ 2.087,60	R\$ -	R\$ 2.087,60	R\$ -	66,46%
10.13	C1120	JUNTA ATE 2mm EM CERÂMICA, (900 cm²) (PAREDE/PISO)	M2	85,25	R\$ 13,26	R\$ 1.130,42	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
10.14	C4442	CERÂMICA ESMALTADA C/ARG. PRÉ-FABRICADA ATE 10x10cm (100cm²) - DECORATIVA - P/ PAREDE	M2	2,80	R\$ 102,02	R\$ 285,66	7,61	-	7,61	R\$ 776,37	R\$ -	R\$ 776,37	R\$ -	271,78%
11	SISTEMA HIDRAULICO				R\$	R\$ 6.038,04								
11.1	C1619	LAVATORIO DE LOUÇA BRANCA SICOLUNA C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS	UN	5,00	R\$ 613,37	R\$ 3.066,85	5,00	-	5,00	R\$ 3.066,85	R\$ -	R\$ 3.066,85	R\$ -	100,00%
11.2	C0348	BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA	UN	3,00	R\$ 730,95	R\$ 2.192,85	3,00	-	3,00	R\$ 2.192,85	R\$ -	R\$ 2.192,85	R\$ -	100,00%
11.3	C2504	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA LONGA P/PIA	UN	5,00	R\$ 155,67	R\$ 778,35	5,00	-	5,00	R\$ 778,35	R\$ -	R\$ 778,35	R\$ -	100,00%
					TOTAL C/ BDI:	R\$ 169.041,00				R\$ 73.798,86	R\$ 68.941,52	R\$ 142.740,38	R\$ 10.890,44	84,44%

O VALOR DA PRESENTE MEDIÇÃO E DE R\$ 73.798,86 (SETENTA E TRÊS MIL SETECENTOS E NOVENTA E OITO REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS)

Paulo Henrique Muniz
Engenheiro Civil

GUILHERME OTAVIO
DO NASCIMENTO

Assinado de forma digital
por GUILHERME OTAVIO
DO NASCIMENTO

ARITEC CONSTRUTORA
E ARQUITETURA

Assinado de forma digital
por GUILHERME OTAVIO
DO NASCIMENTO

ARITEC CONSTRUTORA
E ARQUITETURA

SILVA:62476594318

SILVA:62476594318

LTDA:51007107000100

ARITEC CONSTRUTORA
E ARQUITETURA

LTDA:51007107000100



REFORMA E AMPLIAÇÃO DA USB LEOGIVILDO BARROSO NO MUNICIPIO DE SÃO LUIS DO CURU-CE.

LOCAL: MUNICIPIO DE SÃO LUIS DO CURU - CE

EMPRESA: ARKTEC CONSTRUTORA E ARQUITETURA LTDA

CNPJ: 51.007.107/0001-00

CRONOGRAMA FISICO-FINANCIERO

CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO LUIS DO CURU

LICITAÇÃO: 20260097

BDI: 23,38%

BOLETIM DE MEDIÇÃO N°: 02
PRAZO DE OBRA: 2 MESES
PERIODO DE MEDIÇÃO: 01/04/2026 - 19/03/2026

SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$	163.002,96	MEDIÇÃO 01			MEDIÇÃO 02			MEDIÇÃO 03			TOTAL		
			R\$	%	R\$	R\$	%	R\$	R\$	%	R\$	R\$	%	
1	R\$	26.192,35	19.683,96	75,15%	4.881,30	18,64%	1.627,09	6,21%	24.585,26	93,79%	24.585,26	100,00%		
2	R\$	7.497,13	-	0,00%	2.421,08	32,29%	-	0,00%	2.421,08	32,29%	2.421,08	32,29%		
3	R\$	25.441,49	25.441,49	100,00%	-	0,00%	-	0,00%	25.441,49	100,00%	25.441,49	100,00%		
4	R\$	20.632,33	3.434,79	16,65%	17.197,54	83,35%	-	0,00%	20.632,33	100,00%	20.632,33	100,00%		
5	R\$	24.155,51	-	0,00%	15.069,03	62,38%	-	0,00%	15.069,03	62,38%	15.069,03	62,38%		
6	R\$	11.551,94	11.551,94	100,00%	-	0,00%	-	0,00%	11.551,94	100,00%	11.551,94	100,00%		
7	R\$	5.828,70	5.828,70	100,00%	-	0,00%	-	0,00%	5.828,70	100,00%	5.828,70	100,00%		
8	R\$	3.000,63	3.000,64	100,00%	-	0,00%	-	0,00%	3.000,64	100,00%	3.000,64	100,00%		
9	R\$	171,50	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%		
10	R\$	38.531,38	68.941,52	177,48%	34.229,91	88,84%	-	0,00%	34.229,91	88,84%	34.229,91	88,84%		
TOTAL		R\$ 163.002,96	R\$ 68.941,52	42,29%	R\$ 142.740,38	87,71%	R\$ -	0,00%	R\$ 73.060,16	44,82%	R\$ 73.060,16	44,82%		


ARKTEC
CONSTRUTORA E
ARQUITETURA
LTD.A:51007107000100

Assinado de forma
digital por ARKTEC
CONSTRUTORA E
ARQUITETURA
LTD.A:51007107000100


GUILHERME OTAVIO
DO NASCIMENTO
SILVA:62476594318

Assinado de forma digital
por GUILHERME OTAVIO
DO NASCIMENTO
SILVA:62476594318


Paulo Henrique Muniz
Engenheiro Civil
CREA/CE: 50.456-D


		MEMÓRIA DE CÁLCULO			
REFORMA E AMPLIAÇÃO DA USB LEOGIVILDO BARROSO NO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS DO CURU-CE.		CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO LUÍS DO CURU			
LOCAL: MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS DO CURU - CE		CONTRATO:	20260097	BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº: 02	
EMPRESA: ARKTEC CONSTRUTORA E ARQUITETURA LTDA				PRAZO DE OBRA: 2 MESES	
CNPJ: 51.007.107/0001-00		BDI:	23,38%	PERÍODO DE MEDIÇÃO: 01/04/2026 - 19/05/2026	

SERVIÇOS PRELIMINARES					
1.1 PLACA PADRÃO DE OBRA					
	altura	comprimento	quantidade	total	local
	2,00	3,00	1,00	6,00	fachada principal
			total	6,00	m2
1.2 ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE MAT. C/AQUISIÇÃO					
			quantidade	total	local
			24,00	24,00	aterro
			total	24,00	m3
1.3 DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LÁSTRO DE CONCRETO					
	largura	comprimento	total	total	local
	5,04	3,15	15,88	15,88	hall
	3,15	2,48	7,81	7,81	same
	3,15	3,52	11,09	11,09	cons. Enfermagem
	2,97	2,10	6,24	6,24	vacina
	2,97	2,10	6,24	6,24	procedimentos
	2,97	3,12	9,27	9,27	acs
	1,55	2,76	4,28	4,28	esterelização
	1,55	2,88	4,46	4,46	expurgo
	2,97	1,66	4,93	4,93	farmácia
	2,97	3,24	9,62	9,62	cons. Médico
	2,97	3,25	9,65	9,65	odontologia
	1,56	3,00	4,68	4,68	cozinha

		MEMÓRIA DE CÁLCULO			
REFORMA E AMPLIAÇÃO DA USB LEOGIVILDO BARROSO NO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS DO CURU-CE.		CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO LUÍS DO CURU			
LOCAL: MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS DO CURU - CE		CONTRATO:	20260097	BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº: 02	
EMPRESA: ARKTEC CONSTRUTORA E ARQUITETURA LTDA				PRAZO DE OBRA: 2 MESES	
CNPJ: 51.007.107/0001-00		BDI:	23,38%	PERÍODO DE MEDIÇÃO: 01/04/2026 - 19/05/2026	


			1,65	1,45	2,39	recepção
			1,65	1,40	2,31	despensa
			18,10	1,32	23,89	circulação 01
			1,15	3,15	3,62	circulação 02
			total		126,36	m2
1.4 DEMOLIÇÃO DE COBERTURA C/TELHAS CERÂMICAS						
		percentual	quantidade	total	total	local
		20%	146,18	29,24	29,24	coberta
			total		29,24	m2
1.5 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TELHOS S/ REAPROVEITAMENTO						
	largura	altura	quantidade	total	total	local
	0,15	2,20	68,02	22,45	22,45	muro
			total		22,45	m3
1.6 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES						
			quantidade	total	total	local
			40,00	40,00	40,00	adm. nstração
			total		40,00	H
1.7 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CARGAMASSA						
lados	altura	largura	comprimento	total	total	local
2	1,45	5,04	3,15	23,75	23,75	hall
2	1,45	1,65	1,45	8,99	8,99	recepção
2	1,45	1,65	1,40	8,35	8,35	despensa
2	1,45	18,10	1,32	56,32	56,32	circulação 01


 Paulo Henrique Muniz
 Engenheiro Civil
 CREA/CE: 50.456-D


		MEMÓRIA DE CÁLCULO			
REFORMA E AMPLIAÇÃO DA USB LEOGIVILDO BARROSO NO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS DO CURU-CE.		CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO LUÍS DO CURU			
LOCAL: MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS DO CURU - CE EMPRESA: ARKTEC CONSTRUTORA E ARQUITETURA LTDA CNPJ: 51.007.107/0001-00		CONTRATO: 20260097	BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº: 02		
		BDI: 23,38%	PRAZO DE OBRA: 2 MESES		
			PERÍODO DE MEDIÇÃO: 01/04/2026 - 19/05/2026		


2	1,45	1,15	3,15	12,47	circulação 02
total				110,37	m2

REVESTIMENTOS						
3.1 CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SI/PENEIRAR, TRAÇO 1:3 ESP. = 5mm P/ PAREDE						
lados	altura	largura	comprimento	total	local	
2	1,45	5,04	3,15	23,75	hall	
2	1,45	1,65	1,45	8,99	recepção	
2	1,45	1,65	1,40	8,85	despensa	
2	1,45	18,10	1,32	56,32	circulação 01	
2	1,45	1,15	3,15	12,47	circulação 02	
total				110,37	m2	
3.2 EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SI/ PENEIRAR, TRAÇO 1:8						
lados	altura	largura	comprimento	total	local	
2	1,45	5,04	3,15	23,75	hall	
2	1,45	1,65	1,45	8,99	recepção	
2	1,45	1,65	1,40	8,85	despensa	
2	1,45	18,10	1,32	56,32	circulação 01	
2	1,45	1,15	3,15	12,47	circulação 02	
total				110,37	m2	
3.3 CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ACMA DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PAREDE						
lados	altura	largura	comprimento	total	local	

		MEMÓRIA DE CÁLCULO			
REFORMA E AMPLIAÇÃO DA USB LEOGIVILDO BARROSO NO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS DO CURU-CE.		CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO LUÍS DO CURU			
LOCAL: MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS DO CURU - CE EMPRESA: ARKTEC CONSTRUTORA E ARQUITETURA LTDA CNPJ: 51.007.107/0001-00		CONTRATO: 20260097	BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº: 02		
		BDI: 23,38%	PRAZO DE OBRA: 2 MESES		
			PERÍODO DE MEDIÇÃO: 01/04/2026 - 19/05/2026		


2	1,35	5,04	3,15	22,11	hall	
2	1,35	1,65	1,45	8,37	recepção	
2	1,35	1,65	1,40	8,24	despensa	
2	1,35	18,10	1,32	52,43	circulação 01	
2	1,35	1,15	3,15	11,61	circulação 02	
total				102,76	m2	
3.4 REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)						
lados	altura	largura	comprimento	total	local	
2	1,35	5,04	3,15	22,11	hall	
2	1,35	1,65	1,45	8,37	recepção	
2	1,35	1,65	1,40	8,24	despensa	
2	1,35	18,10	1,32	52,43	circulação 01	
2	1,35	1,15	3,15	11,61	circulação 02	
total				102,76	m2	
3.5 CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 10x10cm (100cm²) - DECORATIVA - P/ PAREDE						
lados	altura	largura	comprimento	total	local	
2	0,10	5,04	3,15	1,64	hall	
2	0,10	1,65	1,45	0,62	recepção	
2	0,10	1,65	1,40	0,61	despensa	
2	0,10	18,10	1,32	3,88	circulação 01	
2	0,10	1,15	3,15	0,86	circulação 02	
total				7,61	m2	


Paulo Henrique Muniz
 Engenheiro Civil
 CREA/CE: 50.456-D

		MEMÓRIA DE CÁLCULO			
REFORMA E AMPLIAÇÃO DA USB LEOGVILDO BARROSO NO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS DO CURU - CE.		CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO LUÍS DO CURU			
LOCAL: MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS DO CURU - CE EMPRESA: ARKTEC CONSTRUTORA E ARQUITETURA LTDA CNPJ: 51.007.107/0001-00		CONTRATO: 20260097	BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº: 02		
		BDI: 23,38%	PRAZO DE OBRA: 2 MESES		
				PERÍODO DE MEDIÇÃO: 01/04/2026 - 19/05/2026	

3.6 (PAREDE/PISO)					
quadros	altura	largura	comprimento	total	local
2		0,10	5,04	3,15	1,64 hall
2		0,10	1,65	1,45	0,62 recepção
2		0,10	1,65	1,40	0,61 dispensa
2		0,10	16,10	1,32	3,88 circulação 01
2		0,10	1,15	3,15	0,86 circulação 02
				total	7,81 m2


4.2 PISO					
REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4 - ESP# 3cm					
quadros	altura	largura	comprimento	total	local
			5,04	3,15	15,88 hall
			3,15	2,46	7,81 sala
			3,15	3,52	11,09 cons. Enfermagem
			2,97	2,10	6,24 vacina
			2,97	2,10	6,24 procedimentos
			2,97	3,12	9,27 acs
			1,55	2,76	4,28 esterilização
			1,55	2,88	4,46 expurgo
			2,97	1,66	4,93 farmácia
			2,97	3,24	9,62 cons. Médico
			2,97	3,25	9,65 odontologia

		MEMÓRIA DE CÁLCULO			
REFORMA E AMPLIAÇÃO DA USB LEOGVILDO BARROSO NO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS DO CURU - CE.		CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO LUÍS DO CURU			
LOCAL: MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS DO CURU - CE EMPRESA: ARKTEC CONSTRUTORA E ARQUITETURA LTDA CNPJ: 51.007.107/0001-00		CONTRATO: 20260097	BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº: 02		
		BDI: 23,38%	PRAZO DE OBRA: 2 MESES		
				PERÍODO DE MEDIÇÃO: 01/04/2026 - 19/05/2026	

		1,56	3,00	4,68	cozinha
		1,65	1,45	2,39	recepção
		1,65	1,40	2,31	dispensa
		1,15	3,15	3,62	circulação 02
				total	102,47 m2


5 SISTEMA ELÉTRICO E LÓGICO					
6.1 PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO					
quadros	quantidade	total	local		
	16,00	16,00	salas		
		total	16,00	PT	
6.2 LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/1 LÂMPADA DE 20W					
	3,00	3,00	recepção		
	5,00	5,00	circulação		
		total	8,00	unid	
6.3 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A					
	6,00	6,00	quadro geral		
		total	6,00	unid	
6.4 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 12 DIVISÕES 207X332X95mm, C/ABRACAMENTO					
	1,00	1,00	quadro geral		


 Paulo Henrique Muniz
 Engenheiro Civil
 CREA/CE: 50.456-D

		MEMÓRIA DE CÁLCULO	
REFORMA E AMPLIAÇÃO DA USB LEOGIVILDO BARROSO NO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS DO CURU-CE.		CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO LUÍS DO CURU	
LOCAL: MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS DO CURU - CE EMPRESA: ARKTEC CONSTRUTORA E ARQUITETURA LTDA CNPJ: 51.007.107/0001-00		CONTRATO: 20260097	BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº: 02
		BDI: 23,38%	PRAZO DE OBRA: 2 MESES
		PERÍODO DE MEDIÇÃO: 01/04/2026 - 19/05/2026	

6.5	ELETRODUTO PVC ROSC. D= 25mm (3/4")			1,00	unid.
	comprimento	total	local		
	50,00	50,00			cabo
total 50,00 m					
6.6	PROJETOR EM ALUMÍNIO, C/ LÂMPADA DE VAPOR METÁLICO E FOTOCÉLULA ATÉ 400W				
	quantidade	total	local		
	2,00	2,00			sistema elétrico
total 2,00 unid.					
6.7	TGMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A 250V				
	quantidade	total	local		
	8,00	8,00			quantidade
total 8,00 unid.					
6.8	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2				
	quantidade	total	local		
	330,00	330,00			quantidade
total 330,00 unid.					

7 COBERTURA					
7.1	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA COM 50% NOVA				
	percentual	quantidade	total	local	
	20%	146,18	29,24		coBERTA
total 29,24 m2					

		MEMÓRIA DE CÁLCULO	
REFORMA E AMPLIAÇÃO DA USB LEOGIVILDO BARROSO NO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS DO CURU-CE.		CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO LUÍS DO CURU	
LOCAL: MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS DO CURU - CE EMPRESA: ARKTEC CONSTRUTORA E ARQUITETURA LTDA CNPJ: 51.007.107/0001-00		CONTRATO: 20260097	BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº: 02
		BDI: 23,38%	PRAZO DE OBRA: 2 MESES
		PERÍODO DE MEDIÇÃO: 01/04/2026 - 19/05/2026	

7.1	CALHA DE CHAPA GALVANIZADA 28 DESENVOLVIMENTO 33cm				
	quantidade	total	local		
	44,00	44,00			cobertura
total 44,00 m					


8 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA					
8.1	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE				
	quantidade	total	local		
	28,22	28,22			entulho
total 28,22 m3					
8.2	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 20KM				
	quantidade	total	local		
	28,22	28,22			entulho
total 28,22 m3					

ARKTEC
 CONSTRUTORA E
 ARQUITETURA
 LTDA: 51007107000100

Assinado de forma digital
 por ARKTEC
 CONSTRUTORA E
 ARQUITETURA
 LTDA: 51007107000100

GUILHERME OTAVIO
 DO NASCIMENTO
 SILVA: 62476594318

Assinado de forma digital
 por GUILHERME OTAVIO
 DO NASCIMENTO
 SILVA: 62476594318


 Paulo Henrique Muniz
 Engenheiro Civil
 CREA/CE: 50.456-D



CONTRATADA:
ARKTEC CONSTRUTORA E ARQUITETURA LTDA

DIÁRIO DE OBRA

CONTRATANTE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS DO CURU - CE

Obra: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA USB LEOGIVILDO BARROSO NO MUNICÍPIO DE SÃO LUIS DO CURU-CE.

Data do serviço 01/04/2026 - 02/04/2026

Prazo da obra -

Data do contrato -

Contrato Nº 20260097 Dia da semana D S T Q X Q X S S

MÃO DE OBRA

INDIRETO

DESCRIÇÃO QUANT.

ENGENHEIRO CIVIL 1

DIRETO

QUANT.

2

1

EQUIPAMENTOS

DESCRIÇÃO

Régua

Colher

Betoneira

Penetra

QUANT.

2

2

1

2

TOTAL GERAL MÃO DE OBRA 4,00

TOTAL GERAL DE EQUIPAMENTOS 7,00


DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS

- 1 - COLOCAÇÃO DE PORTAS.
- 2 - EXECUÇÃO DE CERÂMICA ESMALTADA.

OBSERVAÇÕES/COMENTÁRIOS

Assinatura Contratada

Assinatura Fiscalização/Supervisão


Paulo Henrique Muniz
Engenheiro Civil
CREA/CE: 50.456-D

GUILHERME OTAVIO Assinado de forma digital

DO NASCIMENTO por GUILHERME OTAVIO

SILVA:62476594318 DO NASCIMENTO

ARKTEC

CONSTRUTORA E

ARQUITETURA

LTDA:51007107000100

Assinado de forma digital

por ARKTEC

CONSTRUTORA E

ARQUITETURA

LTDA:51007107000100



CONTRATADA:

ARKTEC CONSTRUTORA E ARQUITETURA LTDA

DIÁRIO DE OBRA

CONTRATANTE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS DO CURU - CE

Obra: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA USF LEONILDO BARROSO NO MUNICÍPIO DE SÃO LUIS DO CURU-CE.

Data do serviço 06/04/2026 - 10/04/2026

Prazo da obra

Data do contrato

Contrato Nº 20260097

Dia da semana

D S T Q Q S S

INDIRETO

MÃO DE OBRA

DIRETO

EQUIPAMENTOS

DESCRIÇÃO	QUANT.	DESCRIÇÃO	QUANT.	DESCRIÇÃO	QUANT.
ENGENHEIRO CIVIL	1	Servente	2	Régua	2
		Pedreiro	1	Colher	2
				Betoneira	1
				Penetra	2
TOTAL GERAL MÃO DE OBRA			4,00	TOTAL GERAL DE EQUIPAMENTOS	
				7,00	


DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS

- 1 - EXECUÇÃO DE REJUNTAMENTO.
- 2 - EXECUÇÃO DE PINTURA.

OBSERVAÇÕES/COMENTÁRIOS

Assinatura Contratada

Assinatura Fiscalização/Supervisão


 Paulo Henrique Muniz
 Engenheiro Civil
 CREA/CE: 50.456-D



CONTRATADA:

ARKTEC CONSTRUTORA E ARQUITETURA LTDA

DIÁRIO DE OBRA

CONTRATANTE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS DO CURU - CE

Obra: OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA USB LEOCIVILDO BARROSO NO MUNICÍPIO DE SÃO LUIS DO CURU-CE.

Data do serviço 13/04/2026 - 17/04/2026

Contrato Nº 20260097

Dia da semana

D S T Q Q S S

Data do contrato 13/04/2026 - 17/04/2026

MÃO DE OBRA

INDIRETO	QUANT.	DESCRIÇÃO	DIRETO	QUANT.	DESCRIÇÃO	EQUIPAMENTOS	QUANT.
ENGENHEIRO CIVIL	1	Sarvente	2		Régua	2	
		Pedreiro	1		Colher	2	
					Betoneira	1	
					Penetra	2	
					Picareta	2	
					Pá	2	
					Carrinho de mão	1	
TOTAL GERAL MÃO DE OBRA				4,00		TOTAL GERAL DE EQUIPAMENTOS	12,00

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS

- 1 - ESCAVAÇÃO MANUAL.
- 2 - EXECUÇÃO DE ALVENARIA.

Assinatura Contratada

OBSERVAÇÕES/ COMENTÁRIOS

Assinatura Fiscalização/Supervisão

Paulo Henrique Muniz
 Engenheiro Civil
 CREMACE: 50.456-D



CONTRATADA:

ARKTEC CONSTRUTORA E ARQUITETURA LTDA

DIÁRIO DE OBRA

CONTRATANTE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS DO CURU - CE

Obra: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA USB LEOGUILDO BARROSO NO MUNICÍPIO DE SÃO LUIS DO CURU-CE.

Data do serviço: 20/04/2026 - 24/04/2026

Prazo da obra: -

Data do contrato: -

Contrato Nº: 20260097

Dia da semana

D

S

T

Q

Q

S

S

MÃO DE OBRA

INDIRETO

DESCRIÇÃO	QUANT.	DESCRIÇÃO	QUANT.
ENGENHEIRO CIVIL	1	Servente	2
		Pedreiro	1

DIRETO

DESCRIÇÃO	QUANT.	DESCRIÇÃO	QUANT.
		Regua	2
		Colher	2
		Betoneira	1
		Peneira	2

EQUIPAMENTOS

TOTAL GERAL MÃO DE OBRA		4,00		TOTAL GERAL DE EQUIPAMENTOS		7,00	
-------------------------	--	------	--	-----------------------------	--	------	--

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS


1 - EXECUÇÃO DE FORMATELVA.

2 - EXECUÇÃO DE CONCRETO, LANÇAMENTO E APLICAÇÃO.

Assinatura Contratada

OBSERVAÇÕES/COMENTÁRIOS

Assinatura Fiscalização/Supervisão


 Paulo Henrique Muniz
 Engenheiro Civil
 CREM/CE: 50.456-D



CONTRATADA:

ARKTEC CONSTRUTORA E ARQUITETURA LTDA

DIÁRIO DE OBRA

CONTRATANTE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS DO CURU - CE

Obra: OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA USB LEOCIVILDO BARROSO NO MUNICÍPIO DE SÃO LUIS DO CURU-CE.

Data do serviço 27/04/2026 - 01/05/2026

Prazo da obra

Data do contrato

Contrato Nº

20260097

Dia da semana

D

S

T

Q

Q

S

S

MÃO DE OBRA

INDIRETO

DIRETO

EQUIPAMENTOS

DESCRIÇÃO

QUANT.

DESCRIÇÃO

QUANT.

DESCRIÇÃO

QUANT.

ENGENHEIRO CIVIL

1

Servente

2

Pedreiro

Régua

2

Colher

2

Armador

1

Betoneira

1

Peneira

2

TOTAL GERAL MÃO DE OBRA

5,00

TOTAL GERAL DE EQUIPAMENTOS

7,00

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS


- 1 - EXECUÇÃO DE ARMADURA.
- 2 - EXECUÇÃO DE LAJE.

Assinatura Contratada

OBSERVAÇÕES/COMENTÁRIOS

Assinatura Fiscalização/Supervisão

Paulo Henrique Muniz
 Engenheiro Civil
 OREANCE: 50.458-D



CONTRATADA:

ARCTEC CONSTRUTORA E ARQUITETURA LTDA

DIÁRIO DE OBRA

CONTRATANTE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS DO CURU - CE

Obra: OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA USB LEOCIVIL DO BARROSO NO MUNICÍPIO DE SÃO LUIS DO CURU-CE.

Data do serviço: 04/05/2026 - 08/05/2026

Prazo da obra: -

Contrato Nº: 20260097

Dia da semana

D

S

T

Q

Q

S

S

MÃO DE OBRA

INDIRETO

DIRETO

EQUIPAMENTOS

INDIRETO	QUANT.	DESCRIÇÃO	DIRETO	QUANT.	DESCRIÇÃO	EQUIPAMENTOS	QUANT.
ENGENHEIRO CIVIL	1	Servente	2		Régua	2	
		Pedreiro	1		Colher	2	
		Armador	1		Betoneira	1	
					Peneira	2	
TOTAL GERAL MÃO DE OBRA			5,00				
TOTAL GERAL DE EQUIPAMENTOS						7,00	

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS

- 1 - EXECUÇÃO DE ARMADURA.
- 2 - EXECUÇÃO DE LAJE.

Assinatura Contratada

OBSERVAÇÕES/COMENTÁRIOS

Assinatura Fiscalização/Supervisão

Paulo Henrique Muniz
 Engenheiro Civil
 CREMCE: 59.458-D



CONTRATADA:

ARCTEC CONSTRUTORA E ARQUITETURA LTDA

DIÁRIO DE OBRA

CONTRATANTE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS DO CURU - CE

Obra: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA USB LEO CIVIL DO BARROSO NO MUNICÍPIO DE SÃO LUIS DO CURU-CE.

Data do serviço 18/05/2026 - 19/05/2026

Prazo da obra -

Data do contrato -

Contrato Nº 20260097

Dia da semana

D

S

T

Q

Q

S

S

MÃO DE OBRA

INDIRETO

DIRETO

EQUIPAMENTOS

DESCRIÇÃO	QUANT.	DESCRIÇÃO	QUANT.	DESCRIÇÃO	QUANT.
ENGENHEIRO CIVIL	1	Servente	2	Regua	2
		Pedreiro	1	Colher	2
				Betoneira	1
				Peneira	2
TOTAL GERAL MÃO DE OBRA			4,00	TOTAL GERAL DE EQUIPAMENTOS	
				7,00	

I - EXECUÇÃO DE SISTEMA HIDRÁULICO.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS

Assinatura Contratada

OBSERVAÇÕES/ COMENTÁRIOS

Assinatura Fiscalização/Supervisão



 Paulo Henrique Muniz
 Engenheiro Civil
 CREA/CE: 50.458-D



FOTO 17: Execução de revestimento cerâmico na fachada.



FOTO 18: Execução de revestimento cerâmico na fachada.

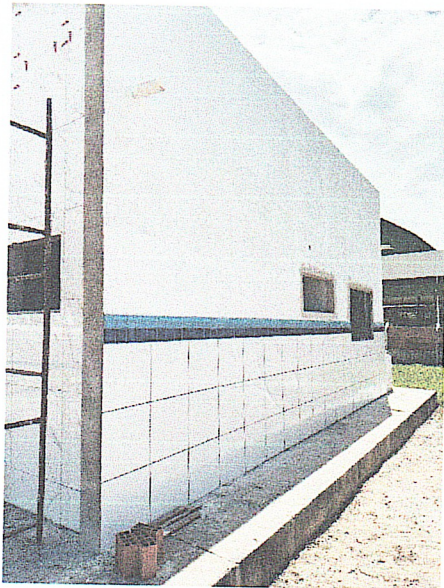


FOTO 19: Acabamento superior em reboco e pintura.



FOTO 19: Execução de revestimento cerâmico até meia parede com acabamento superior.



FOTO 13: Manutenção do sistema hidráulico.



FOTO 14: Aplicação de cerâmica esmaltada.



FOTO 15: Rejuntamento.



FOTO 16: Rejuntamento de piso cerâmico.

Paulo Henrique Muniz
Engenheiro Civil
CREA/CE: 50.456-D



FOTO 9: PREPARO DE MATERIAL PARA PINTURA.



FOTO 10: Revestimento cerâmico e preparo de esquadrias.



FOTO 11: Revestimento cerâmico.



FOTO 12: Revestimento cerâmico.

Paulo Henrique Muniz
Engenheiro Civil
CREA/CE: 60.456-D



FOTO 5: Acabamento e instalação complementares.



FOTO 6: Aplicação de cerâmica esmaltada e acabamento superior em pintura.



FOTO 7: Preparação de esquadrias e revestimento cerâmico.



FOTO 8: Preparação de esquadrias e revestimento cerâmico, preparação de pontos elétricos.



FOTO 1: Preparo de teto para receber pintura.




FOTO 2: Execução de acabamentos internos no corredor da edificação.



FOTO 3: Continuação do acabamento interno no corredor.



FOTO 4: Acabamento em pintura nas paredes internas.


Paulo Henrique Muniz
Engenheiro Civil
CREA/CE: 50.456-D

RELATÓRIO FOTOGRAFICO

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA USB LEOGIVILDO BARROSO NO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS DO CURU-CE.

PERÍODO: 01/04/2026 á 19/05/2026

ARKTEC
CONSTRUTORA E
ARQUITETURA
LTDA:51007107000100

Assinado de forma digital
por ARKTEC CONSTRUTORA
E ARQUITETURA
LTDA:51007107000100

**GUILHERME OTAVIO
DO NASCIMENTO
SILVA:62476594318**

Assinado de forma digital
por GUILHERME OTAVIO
DO NASCIMENTO
SILVA:62476594318


Paulo Henrique Muniz
Engenheiro Civil
CREA/CE: 50.456-D

LUCAS ARAUJO BARBOSA ARQUITETO E URBANISTA
CAU N° A279387-3
ARKTEC CONSTRUTORA E ARQUITETURA LTDA
CNPJ sob nº 51.007.107/0001-00
